


Práctica #5.- Calcular el inicio temprano y tardío, así como la finalización temprana y tardía de las actividades de un proyecto, para gestionar las holguras en el cronograma.

Considera el siguiente diagrama de red. Primero, enlista las rutas abajo, poniendo las duraciones de actividades arriba de cada cuadro, para calcular la duración total de cada ruta y así determinar la ruta crítica. Ponle un asterisco.

Posteriormente, calcula ES, EF, LS y LF para cada actividad de la red.

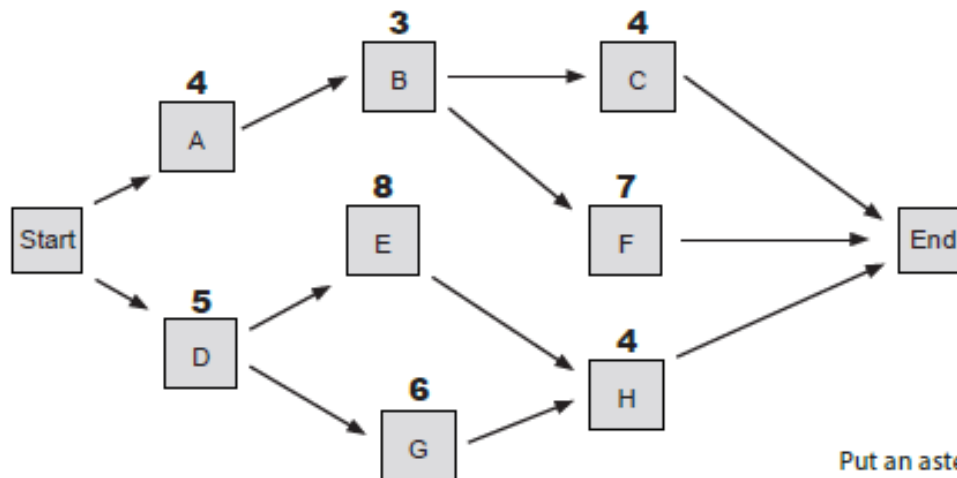

Put an asterisk (*) next to the critical path.

